◇国立原爆死没者追悼平和祈念館　移行スケジュール

作業分担[◎:主担当 ○:副担当]　上段[予定] 下段[実績]　▲:イベント/マイルストーン

作業項目	予定日	作業分担 祈念館様	作業分担 改修業者	作業分担 機器調達業者	備考
イベント・マイルストーン					
サーバ構築	～5/14			◎	
データ移行	4/17～6/25		◎		
総合テスト	5/1～5/14		◎		
操作研修	5/15～5/21	○	◎		
受入れテスト	5/22～5/28	◎			
切替作業	5/29～6/25				
・イベント					
移行作業環境整備					
機器調達・評価環境構築	～4/16			◎	
機器調達・本番環境構築	4/10～5/14			◎	
作業場所確保	4/3	◎			
電源/ネットワーク環境整備	～4/23			◎	
仮想化基盤サーバ構築	～4/23			◎	
広域回線敷設	～5/23			◎	
クラウド回線敷設	～6/4			◎	
インターネット回線敷設	～6/4			◎	
データ更新凍結					
動画データ	4/17～6/25	◎			
遺影データ以外	5/29～6/25				
・サーバ構築					
映像サーバ					
基本セットアップ	4/3～4/21		○	◎	
機器設置/調整	4/11～4/13		◎	◎	
インターネット系サーバ（サービス）					
基本セットアップ	6/5～6/10		○	◎	
機器設置/調整	6/12～6/15		Web 改修業者	◎	
その他サーバ					
基本セットアップ	4/11～4/17		○	◎	
機器設置/調整	4/18～4/20		◎	◎	
・データ移行					
広島					
動画データ（証言動画・記録動画等）					
移行データの確認/精査	～4/2		◎		
新規サーバへの移行	4/17～4/30		◎		
確認作業	5/1		◎		
音声データ（体験記・証言・証言音声等）					
移行データの確認/精査	～4/22		◎		
新規サーバへの移行	4/24～4/25		◎		
確認作業	4/26		◎		
画像データ（体験記・証言・証言音声等）					
移行データの確認/精査	～3/23		◎		
新規サーバへの移行	4/24～4/25		◎		
確認作業	4/26		◎		
管理データ（データベース）					
移行データの確認/精査	～4/19		◎		
移行ツール作成	～4/29		◎		
新規サーバへの移行	4/20～4/21		◎		
新システムへのデータ変換	4/24～4/25		◎		
確認作業	4/26		◎		
認証基盤データ（ユーザ情報）					
移行データの確認/精査	4/24～4/28			◎	
新規サーバへの移行	5/1			◎	
確認作業	5/2			◎	
館内共有データ					
移行データの確認/精査	4/10～4/21	○		◎	
新規サーバへの移行	4/26～4/27 6/7	○		◎	
確認作業	4/28 6/7	◎		◎	
インターネット系データ					
移行データの確認/精査	6/5～6/11		Web 改修業者	◎	
新規サーバへの移行	6/12～6/23		Web 改修業者	◎	
確認作業	6/27		Web 改修業者	◎	

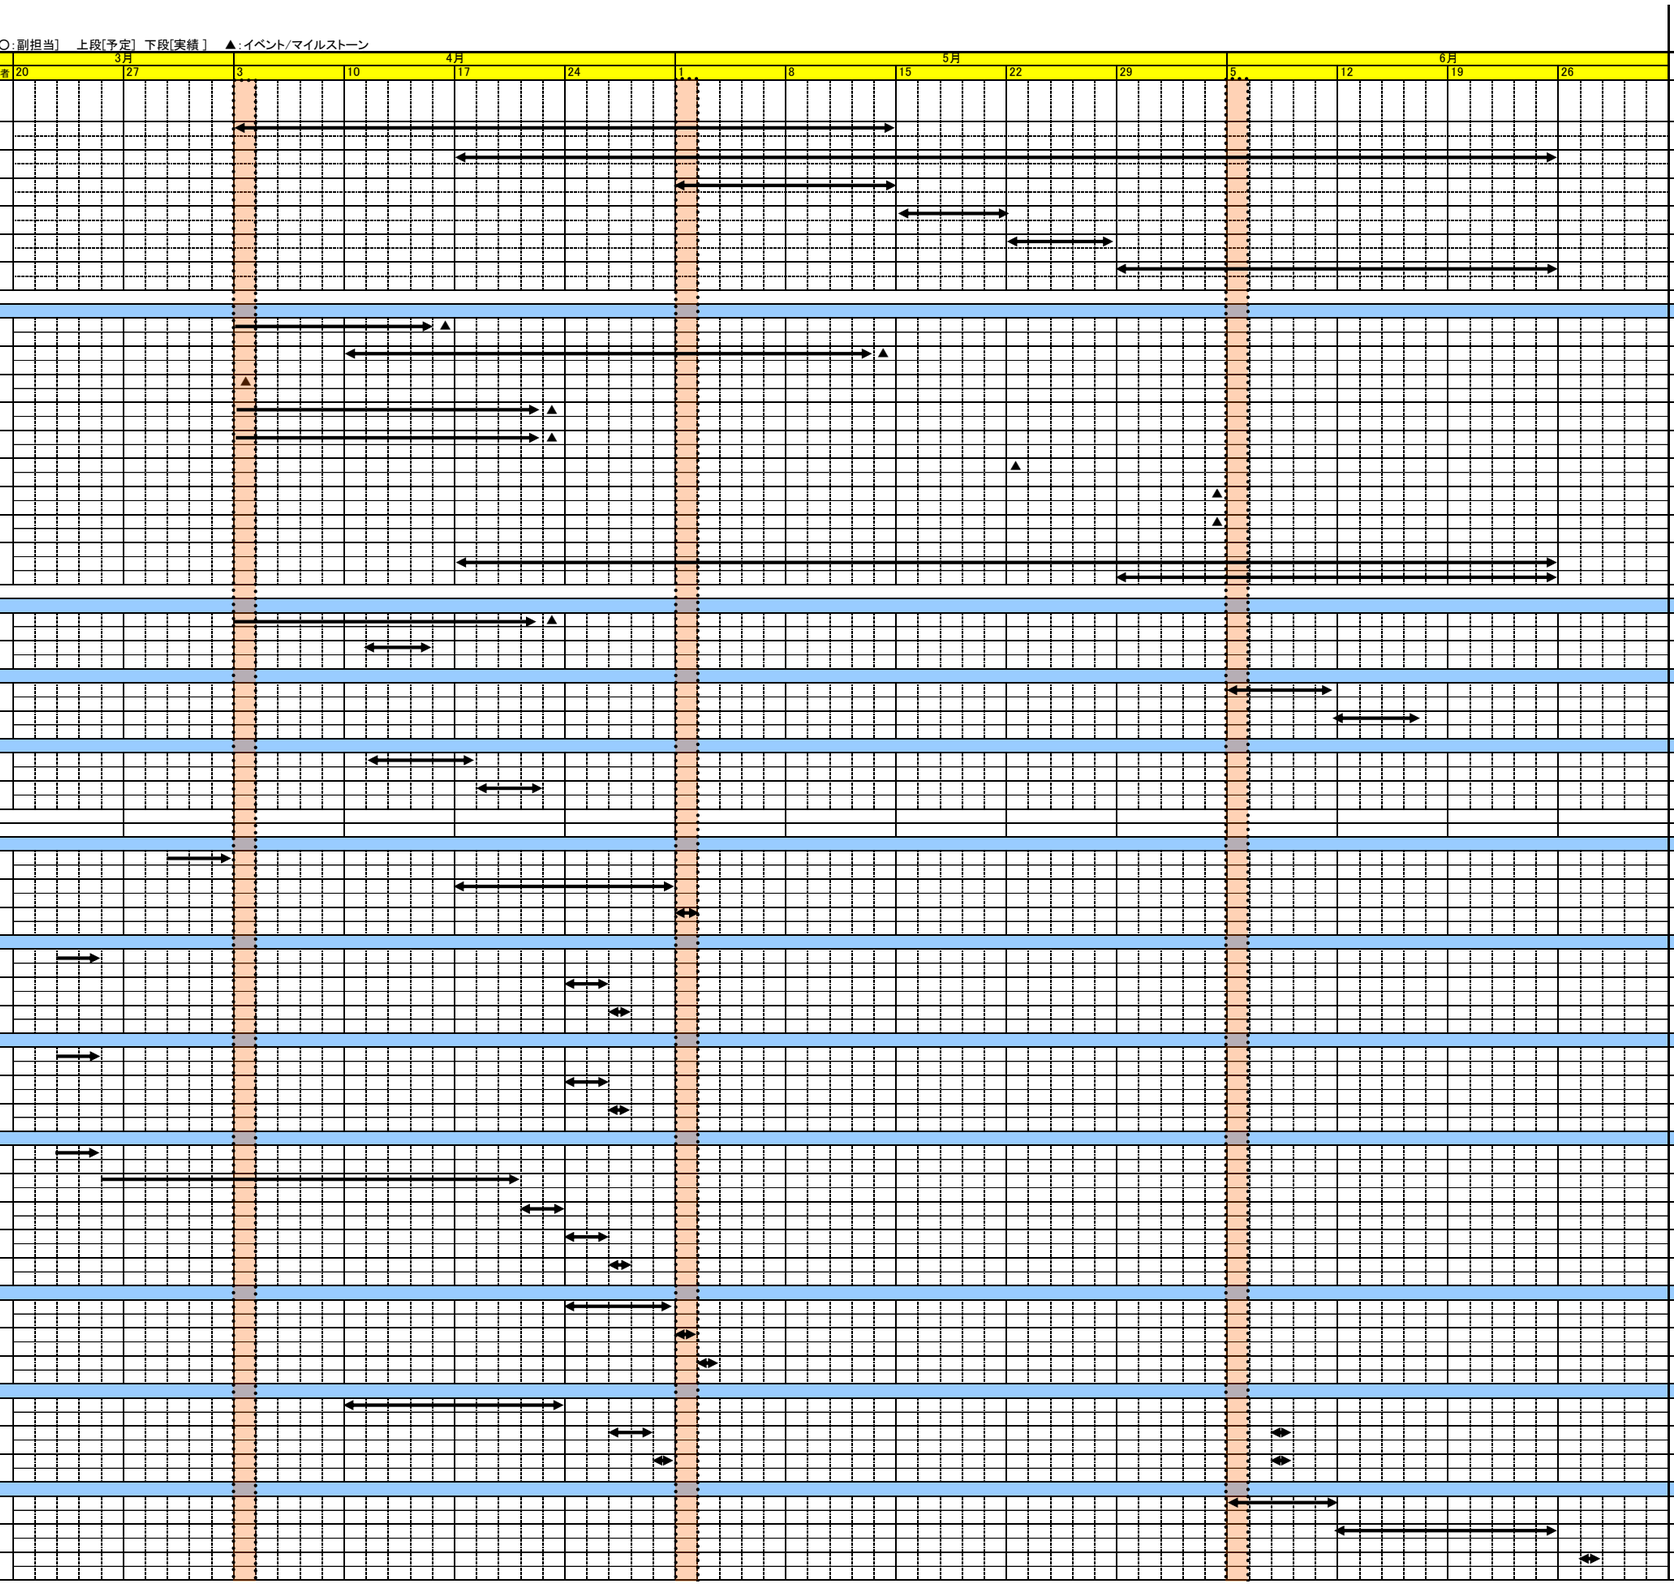

◇国立原爆死没者追悼平和祈念館　移行スケジュール

作業分担[◎:主担当 ○:副担当]　上段[予定] 下段[実績]　▲:イベント/マイルストーン

作業項目	予定日	作業分担 祈念館様	作業分担 改修業者	作業分担 機器調達業者	備考
イベント・マイルストーン					
サーバ構築	～5/14			◎	
データ移行	4/17～6/25		◎		
総合テスト	5/1～5/14		◎		
操作研修	5/15～5/21	○	◎		
受入れテスト	5/22～5/28	◎			
切替作業	5/29～6/25				
・イベント					
移行作業環境整備					
機器調達・評価環境構築	～4/16			◎	
機器調達・本番環境構築	4/10～5/14			◎	
作業場所確保	4/3	◎			
電源/ネットワーク環境整備	～4/23			◎	
仮想化基盤サーバ構築	～4/23			◎	
広域回線敷設	～5/23			◎	
クラウド回線敷設	～6/4			◎	
インターネット回線敷設	～6/4			◎	
データ更新凍結	動画データ 4/17～6/25 遺影データ以外 5/29～6/25	◎			
端末系データ					
移行データの確認/精査	5/29～6/7	○		◎	
新規端末への移行	6/8～6/9	○		◎	
確認作業	6/12	◎		◎	
長崎					
動画データ(証言動画・記録動画等)					
移行データの確認/精査	～4/2		◎		
新規サーバへの移行	5/1～5/14		◎		
確認作業(長崎)	5/15		◎		
音声データ(体験記・証言・証言音声等)					
移行データの確認/精査	～3/23		◎		
新規サーバへの移行	5/8～5/9		◎		
確認作業	5/10		◎		
画像データ(体験記・証言・証言音声等)					
移行データの確認/精査	～3/23		◎		
新規サーバへの移行	5/8～5/9		◎		
確認作業	5/10		◎		
管理データ(データベース)					
移行データの確認/精査	～3/23		◎		
移行ツール作成	～4/20		◎		
新規サーバへの移行	5/4～5/5		◎		
新システムへのデータ変換	5/8～5/9		◎		
確認作業	5/10		◎		
認証基盤データ(ユーザ情報)					
移行データの確認/精査	5/8～5/15			◎	
新規サーバへの移行	5/15			◎	
確認作業	5/16			◎	
館内共有データ					
移行データの確認/精査	5/8～5/9	○		◎	
新規サーバへの移行	5/10～5/11	○		◎	
確認作業	5/12	◎		◎	
インターネット系データ					
移行データの確認/精査	6/5～6/11		Web改修業者	◎	
新規サーバへの移行	6/12～6/25		Web改修業者	◎	
確認作業(長崎)	6/27		Web改修業者	◎	
端末系データ					
移行データの確認/精査	6/12～6/21	○		◎	
新規端末への移行	6/22～6/23	○		◎	
確認作業	6/26	◎		◎	
・機器切替					
広島祈念館サーバ・事務端末機器切替					
認証基盤サーバ					

◇国立原爆死没者追悼平和祈念館　移行スケジュール

作業分担[◎:主担当 ○:副担当]　上段[予定] 下段[実績]　▲:イベント/マイルストーン

作業項目	予定日	作業分担 祈念館様	作業分担 改修業者	作業分担 機器調達業者	備考
イベント・マイルストーン					
サーバ構築	～5/14			◎	
データ移行	4/17～6/25		◎		
総合テスト	5/1～5/14		◎		
操作研修	5/15～5/21	○	◎		
受入れテスト	5/22～5/28	◎			
切替作業	5/29～6/25				
・イベント					
移行作業環境整備					
機器調達・評価環境構築	～4/16			◎	
機器調達・本番環境構築	4/10～5/14			◎	
作業場所確保	4/3	◎			
電源/ネットワーク環境整備	～4/23			◎	
仮想化基盤サーバ構築	～4/23			◎	
広域回線敷設	～5/23			◎	
クラウド回線敷設	～6/4			◎	
インターネット回線敷設	～6/4			◎	
データ更新凍結					
動画データ	4/17～6/25	◎			
遺影データ以外	5/29～6/25				
IB	5/1			◎	・データ移行作業の最初に実施
新					・切替終了まで並行運用
データ移行					
アプリケーションサーバ					
IB	4/24～4/25		◎	◎	・展示機器切替開始直前に最終同期
新	5/26				
データ移行					
DBサーバ					
IB	4/24～4/25		◎	◎	・展示機器切替開始直前に最終同期
新	5/26				
データ移行					
映像サーバ					
IB	4/17～4/30		◎	◎	・容量を考慮し、先行開始
新					
データ移行					
NAS					
IB	4/26～4/27			◎	・職員端末切替直前に最終同期
新	6/9				
データ移行					
Webサーバ					
IB	6/12～6/26		Web 改修業者	○	
新					
データ移行					
メールサーバ					
IB	6/26			◎	
新					
データ移行なし					
職員端末					
IB	5/29～6/7	○		◎	・移行データは新NASに退避
新	6/26				・旧メールサバ停止直前にメールデータ最終取得
データ移行					
館間回線					
IB	～5/28			◎	
新	5/22～				
クラウド回線					
IB				◎	
新	6/5～				
インターネット回線					
IB	～6/26			◎	
新	6/5～				
DNS設定切替	6/26				
旧機器撤去/新機器設置					
IB	6/12～6/13,6/27			◎	・サーバ機器とインターネット機器の2回に分けて実施
新	6/12～6/13,6/27				
広島祈念館展示機器切替					
事前工事	5/15～5/28			◎	
事務室切替					
IB	6/8～6/9			◎	・旧端末に新NASへのアクセス環境を構築
新					・新端末に新旧メールサーバへのアクセス環境を構築
切替					
遺影コーナー（12面・遺影検索）					
IB	5/29～5/30		◎	◎	※開館中の運用停止はしない。
新					
切替					
体験記室(収蔵検索・図書検索・平和情報					
IB	5/31～6/1		◎	◎	※開館中の運用停止はしない。
新					
切替					
展示解説					
IB	6/5～6/6		◎	◎	※開館中の運用停止はしない。
新					
切替					
長崎祈念館サーバ・事務端末機器切替					
認証基盤サーバ					

◇国立原爆死没者追悼平和祈念館　移行スケジュール

作業分担[◎:主担当 ○:副担当]　上段[予定] 下段[実績]　▲:イベント/マイルストーン

作業項目	予定日	作業分担 祈念館様	作業分担 改修業者	作業分担 機器調達業者	備考
イベント・マイルストーン					
サーバ構築	～5/14			◎	
データ移行	4/17～6/25		◎		
総合テスト	5/1～5/14		◎		
操作研修	5/15～5/21	○	◎		
受入れテスト	5/22～5/28	◎			
切替作業	5/29～6/25				
・イベント					
移行作業環境整備					
機器調達・評価環境構築	～4/16			◎	
機器調達・本番環境構築	4/10～5/14			◎	
作業場所確保	4/3	◎			
電源/ネットワーク環境整備	～4/23			◎	
仮想化基盤サーバ構築	～4/23			◎	
広域回線敷設	～5/23			◎	
クラウド回線敷設	～6/4			◎	
インターネット回線敷設	～6/4			◎	
データ更新凍結					
動画データ	4/17～6/25	◎			
遺影データ以外	5/29～6/25				
旧	5/15			◎	
新					
データ移行					
アプリケーションサーバ					
旧	5/8～5/9		◎	◎	・展示機器切替開始直前に最終同期
新	6/9				
データ移行					
DBサーバ					
旧	5/8～5/9		◎	◎	・展示機器切替開始直前に最終同期
新	6/9				
データ移行					
映像サーバ					
旧	5/2～5/14		◎	◎	
新					
データ移行					
NAS					
旧	5/10～5/11			◎	・職員端末切替直前に最終同期
新	6/21				
データ移行					
Webサーバ					
旧	6/12～6/26		Web 改修業者	○	
新					
データ移行					
メールサーバ					
旧	6/26			◎	
新					
データ移行なし					
職員端末					
旧	6/12～6/21	○		◎	・移行データは新NASに退避
新	6/26				・旧メールサバ停止直前にメールデータ最終取得
データ移行					
館間回線					
旧	～5/28			◎	
新	5/22～				
クラウド回線					
旧				◎	
新	6/5～				
インターネット回線					
旧	～6/26			◎	
新	6/6～				
DNS設定切替	6/26				
旧機器撤去/新機器設置					
旧	6/12～6/13, 6/27～6/28			◎	
新	6/12～6/13, 6/27～6/28				
長崎祈念館展示機器切替					
事前工事	5/29～6/11			◎	
事務室切替					
旧	6/22～6/23			◎	・旧端末に新NASへのアクセス環境を構築
新					・新端末に新旧メールサーバへのアクセス環境を構築
切替					
追悼空間前室(8面)、遺影検索					
旧	6/12～6/13		◎	◎	
新					
切替					
遺影手記コーナー(遺影検索・収蔵検索)					
旧	6/14～6/15		◎	◎	
新					
切替					
原爆詩シアター					
旧	6/19～6/20			◎	
新					
切替					
平和情報コーナー①②(平和M・被ばく医					
旧	6/19～6/20		◎	◎	

◇国立原爆死没者追悼平和祈念館　移行スケジュール

作業分担[◎:主担当 ○:副担当]　上段[予定] 下段[実績]　▲:イベント/マイルストーン

作 業 項 目	予定日	作業分担 祈念館様	作業分担 改修業者	作業分担 機器調達業者	備考
イベント・マイルストーン					
サーバ構築	～5/14			◎	
データ移行	4/17～6/25		◎		
総合テスト	5/1～5/14		◎		
操作研修	5/15～5/21	○	◎		
受入れテスト	5/22～5/28	◎			
切替作業	5/29～6/25				
・イベント					
移行作業環境整備					
機器調達・評価環境構築	～4/16			◎	
機器調達・本番環境構築	4/10～5/14			◎	
作業場所確保	4/3	◎			
電源/ネットワーク環境整備	～4/23			◎	
仮想化基盤サーバ構築	～4/23			◎	
広域回線敷設	～5/23			◎	
クラウド回線敷設	～6/4			◎	
インターネット回線敷設	～6/4			◎	
データ更新凍結		◎			
動画データ	4/17～6/25				
遺影データ以外	5/29～6/25				
新					
切替			◎	◎	
